IJ-131

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

868.941

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

13

Compostos utilizados

23 meses de operação

0,89 %

Taxa de refugo

7.744 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-131

868.941
Total Produzido
peças

23
Meses de Operação
Mai/2024 → Mar/2026

13
Compostos Distintos
utilizados

0,89 %
Taxa de Refugo
7.744 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Jul/2025: 213.912 peças
- ✓ N148/18 lidera com 59,61 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 0,89 % no período
- ✓ Última troca em 15/02/2025 — próxima prescrita em 18/11/2025

Aprovado vs. Refugado

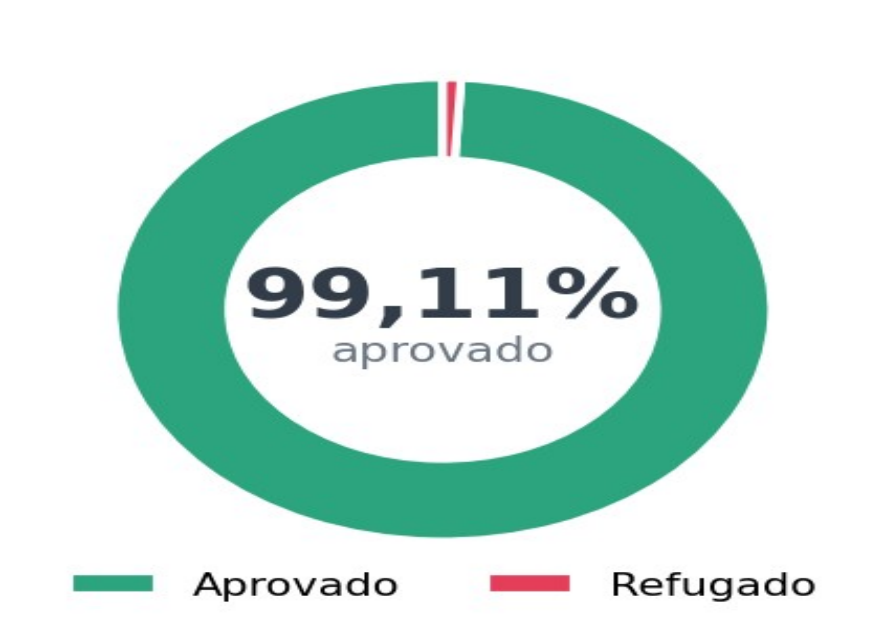

Tendências de Produção Mensal

IJ-131

213.912

Pico de Produção

Jul/2025 — recorde do período

37.780

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

7.186

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado

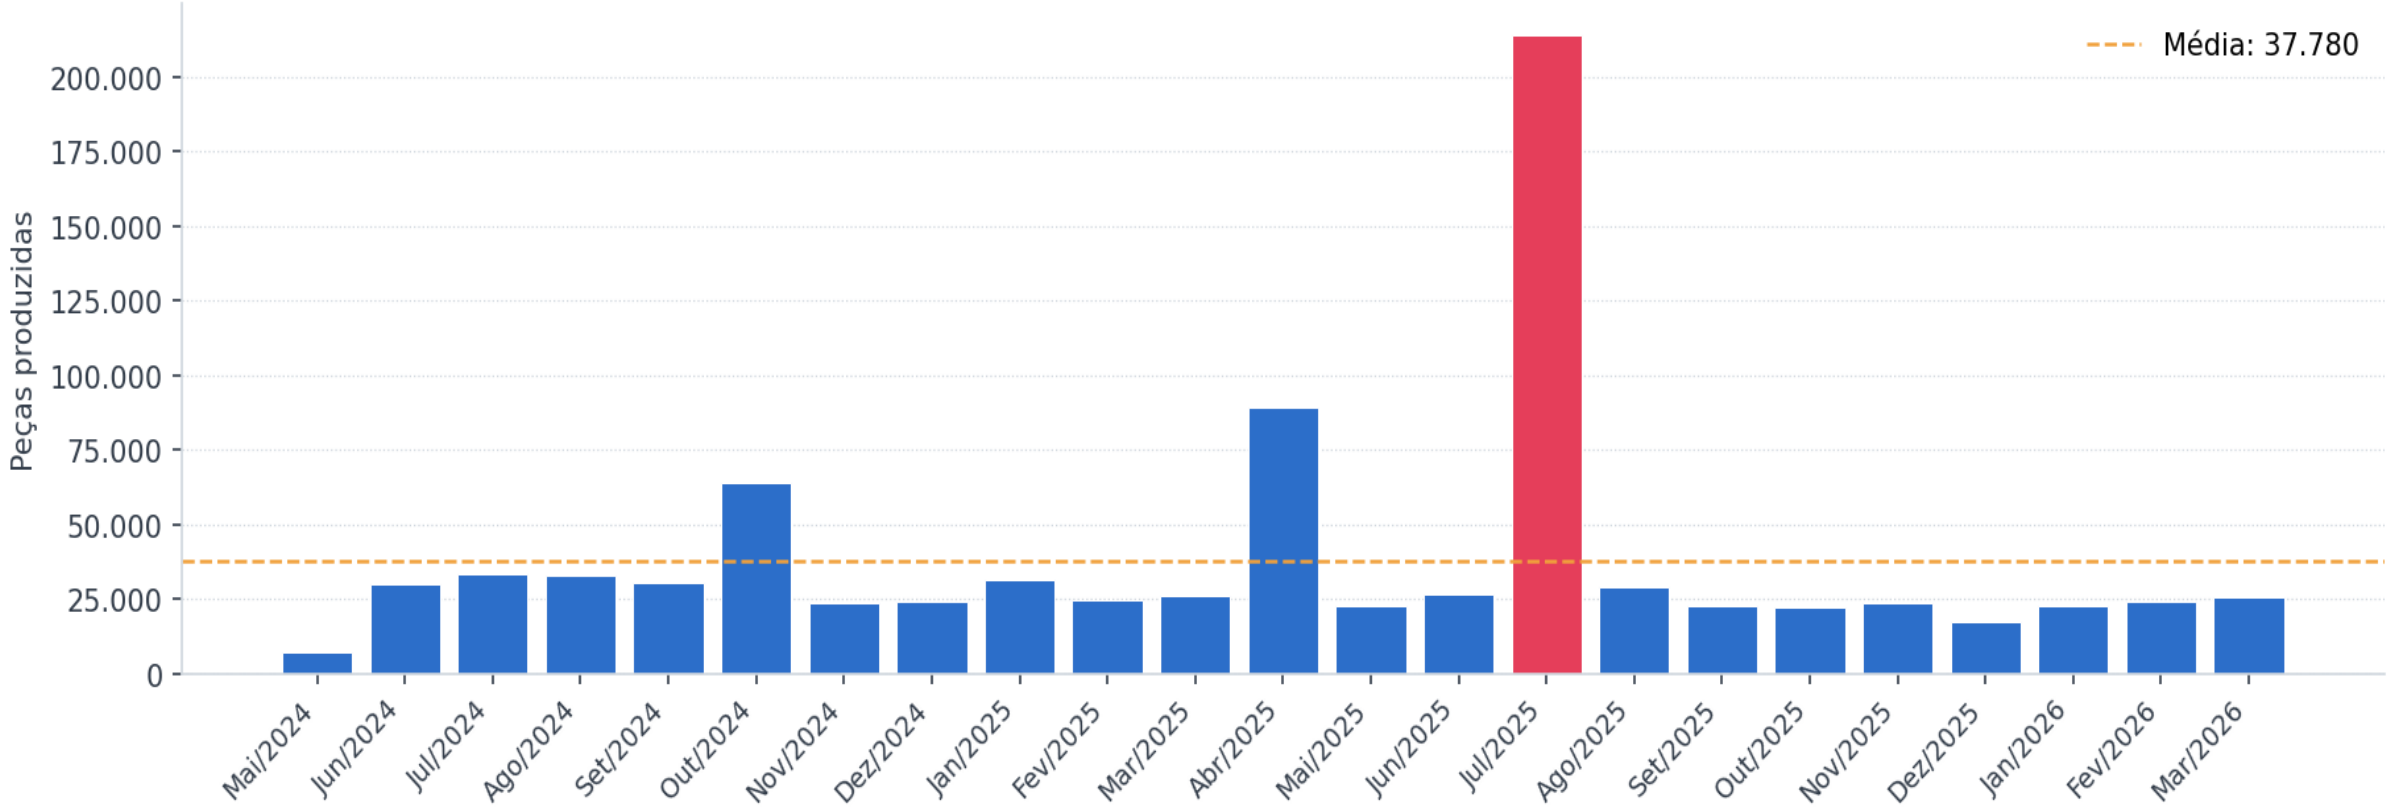

Análise de Materiais e Compostos

IJ-131

Volume por Composto

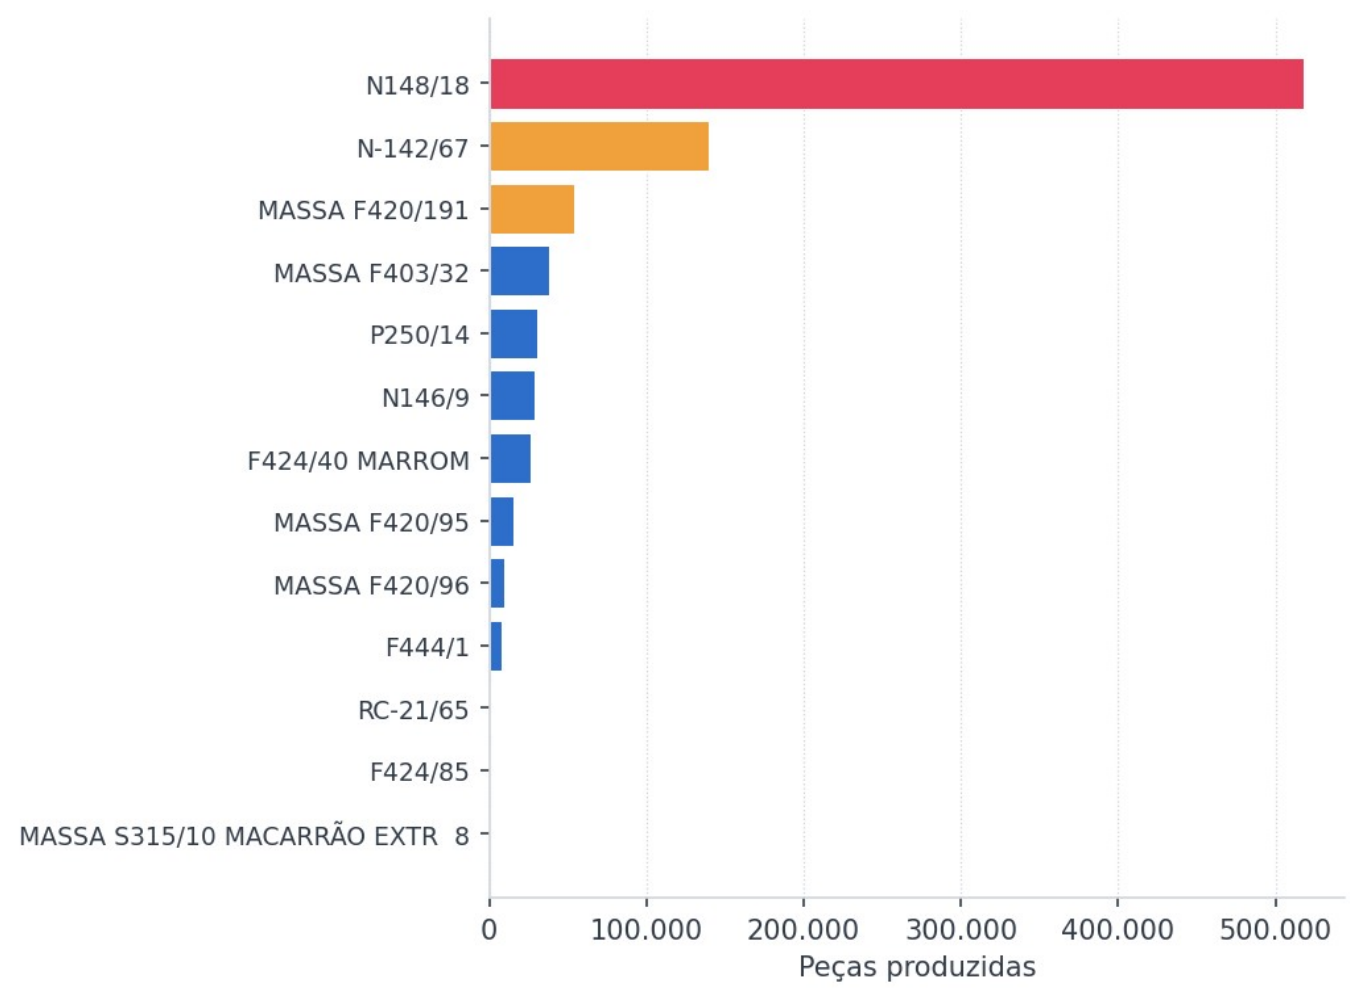

Composto Dominante

N148/18

59,61 %

do total produzido

22 meses com uso

517.963

peças

3.866 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
N148/18	**517.963**	**59,61 %**	**3.866**	**22**
N-142/67	139.753	16,08 %	853	19
MASSA F420/191	53.627	6,17 %	825	10
MASSA F403/32	38.010	4,37 %	593	9
P250/14	30.415	3,50 %	662	5
N146/9	28.798	3,31 %	292	6

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-131

Refugo por Composto

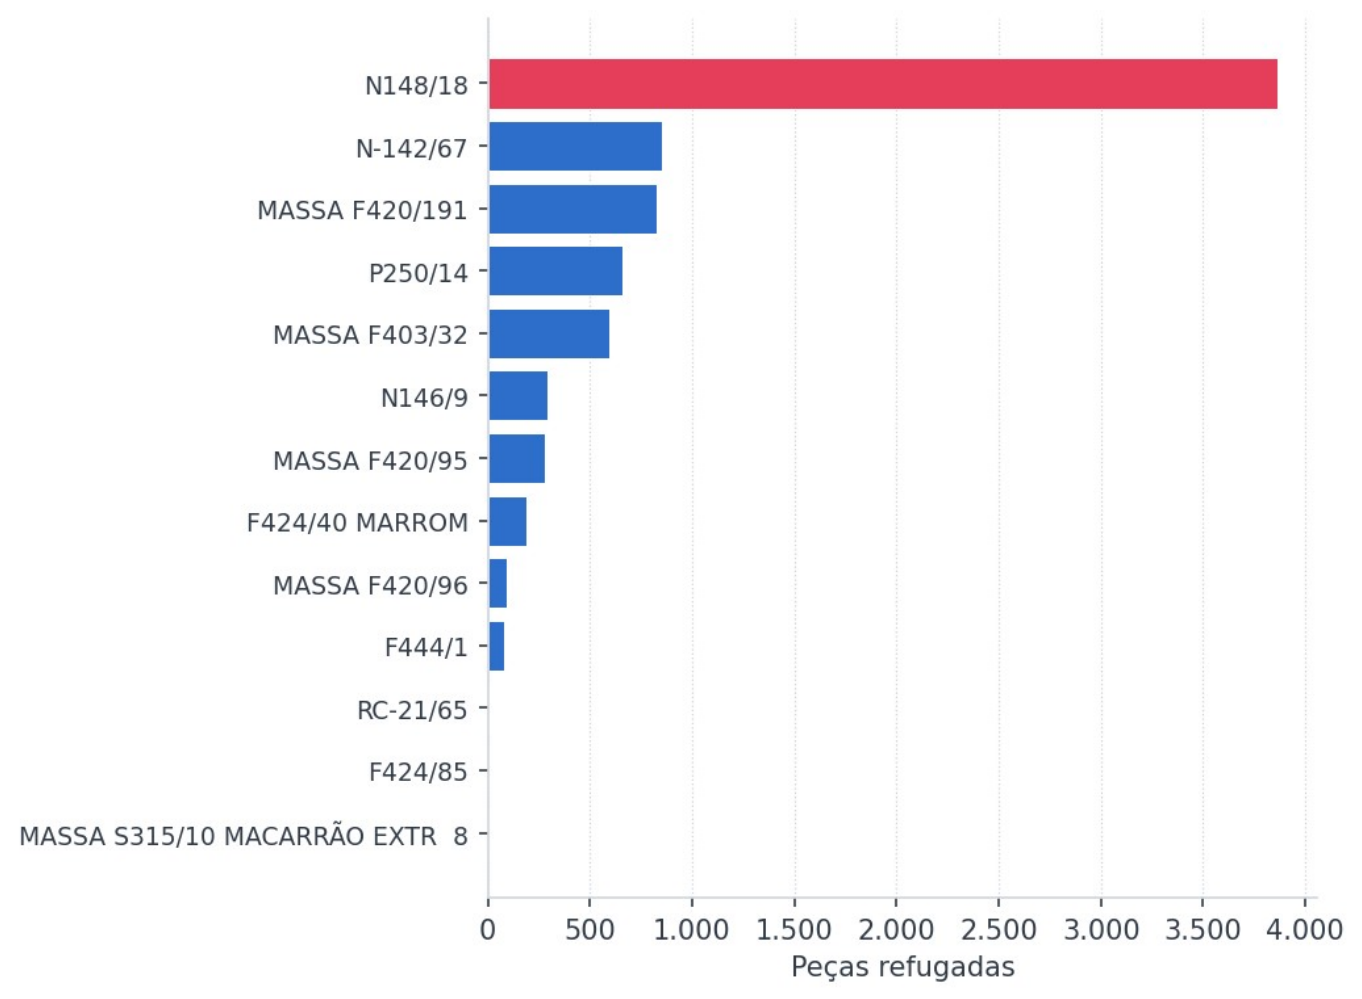

0,89 %

Taxa de Refugo Global

7.744	868.941
Peças refugadas	Total produzido

Dentro do limite aceitável

Análise de Qualidade

- N148/18: maior volume de refugo absoluto (3.866 peças)
- MASSA S315/10 MACARRÃO EXTR 8+/- 1mm: zero refugo registrado em 1 mês(es) de uso
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- ✓ Refugo geral abaixo de 1,5 % no período

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-131

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	356,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	cil. 0,005 / fuso 0,050	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	6.796,25	mediana janelas anteriores: 3.550,29	0,7000	consumiu **1,91×** a massa típica → antecipa a próxima troca (×0,700)
Ociosidade	27	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**249,2 dias**	**356,0 × 1,0000 × 0,7000**	**—**	**Data: 18/11/2025**

ATRASADO

-160

dias restantes

18/11/2025

Próxima manutenção

Última troca: 15/02/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

Principais Conclusões

Produção Consistente

868.941 peças em 23 meses com pico histórico de 213.912 em Jul/2025

Dominância do N148/18

59,61 % da produção — composto principal por 22 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 0,89 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 18/11/2025 — -160 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**868.941 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**13 tipos**
Taxa de Refugo	**0,89 %**
Pico Mensal	**213.912 peças — Jul/2025**
Próxima Manutenção	**18/11/2025 (-160 dias)**
