IJ-118

Relatório Mensal por Componente

Análise de desempenho · Mai/2024 → Mar/2026

Produção · Qualidade · Manutenção

567.451

Peças produzidas

Mai/2024 → Mar/2026

14

Compostos utilizados

23 meses de operação

2,47 %

Taxa de refugo

14.004 peças refugadas

Visão Executiva da Produção

IJ-118

567.451	23	14	2,47 %
Total Produzido	**Meses de Operação**	**Compostos Distintos**	**Taxa de Refugo**
peças	Mai/2024 → Mar/2026	utilizados	14.004 peças

Destaques do Período

- ✓ Pico de produção em Dez/2025: 42.583 peças
- ✓ MASSA S315/10 MACARRÃO EXTR 8+/- 1mm lidera com 28,38 % da produção total
- ✓ Taxa de refugo de 2,47 % no período
- ✓ Última troca em 02/03/2025 — próxima prescrita em 24/12/2025

Aprovado vs. Refugado

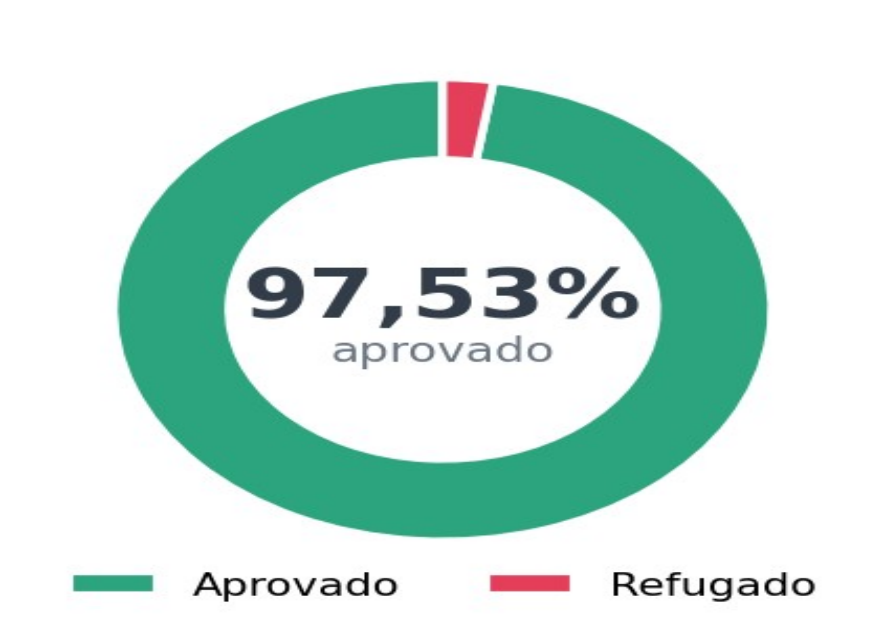

Tendências de Produção Mensal

IJ-118

42.583

Pico de Produção

Dez/2025 — recorde do período

24.672

Média Mensal

Calculada sobre 23 meses

4.823

Menor Mês

Mai/2024 — menor volume registrado

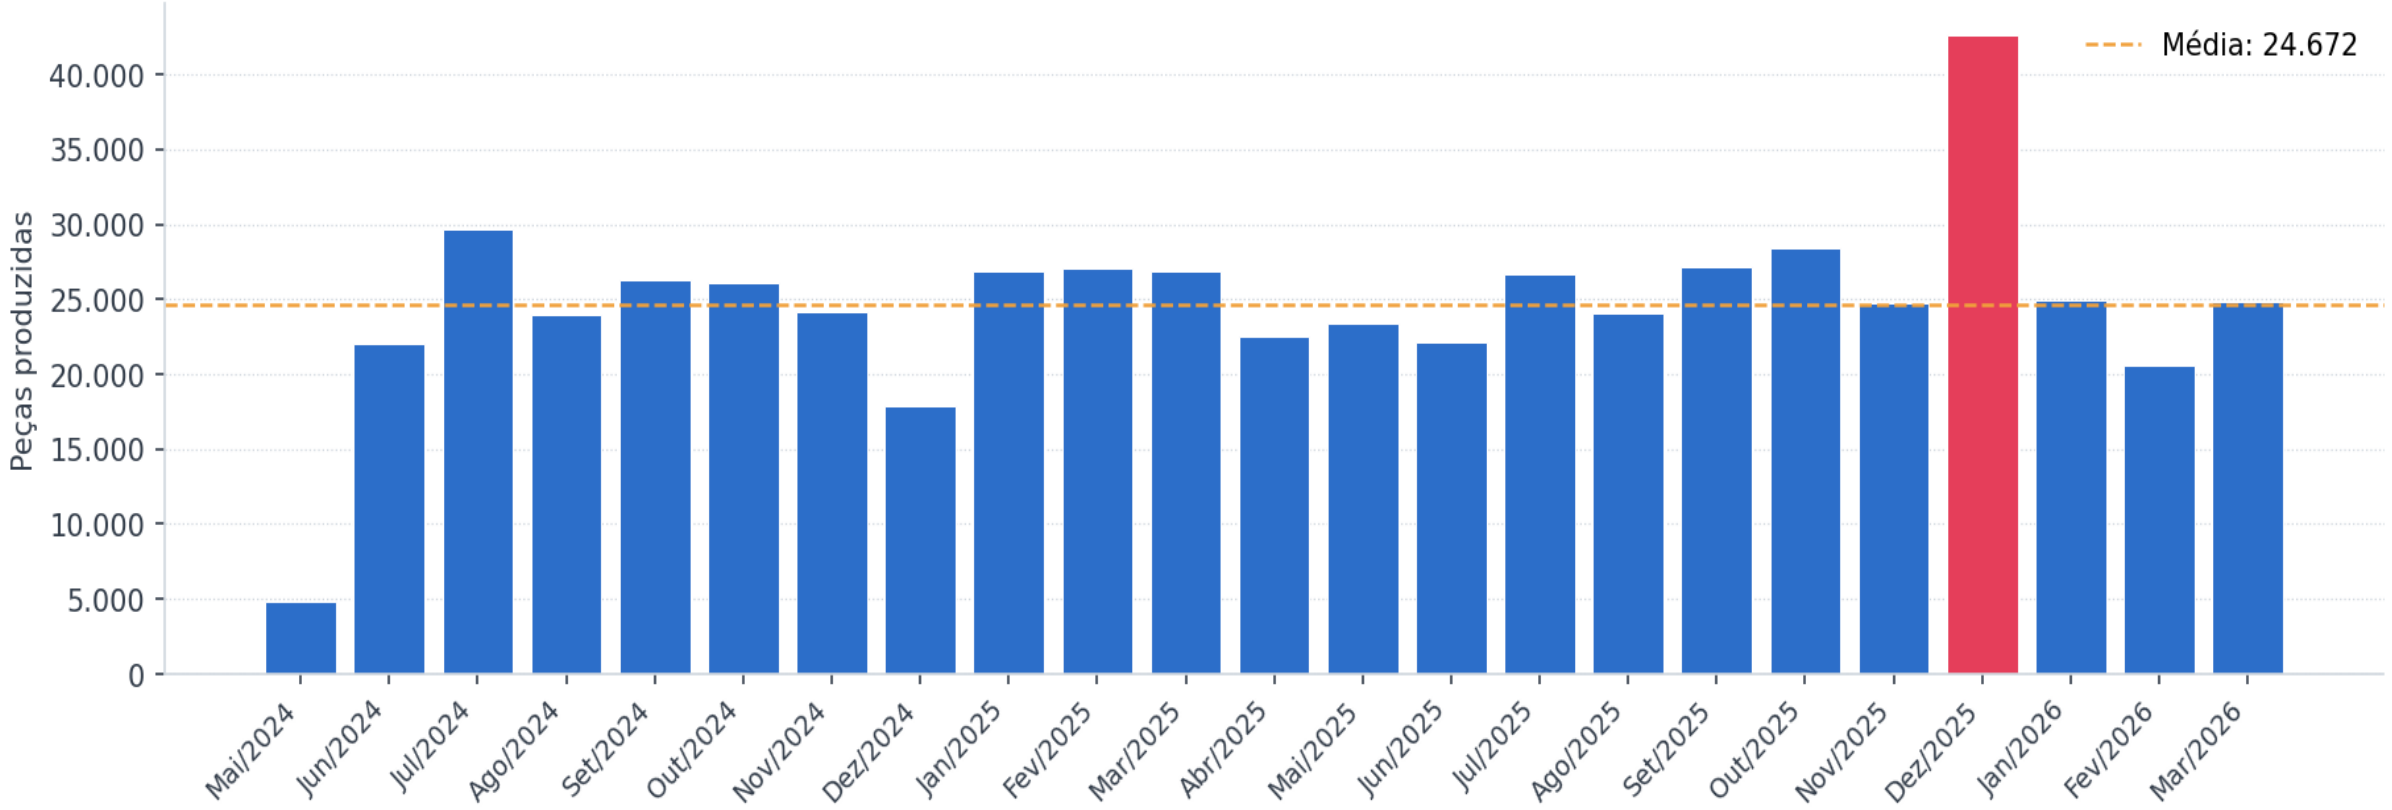

Análise de Materiais e Compostos

IJ-118

Volume por Composto

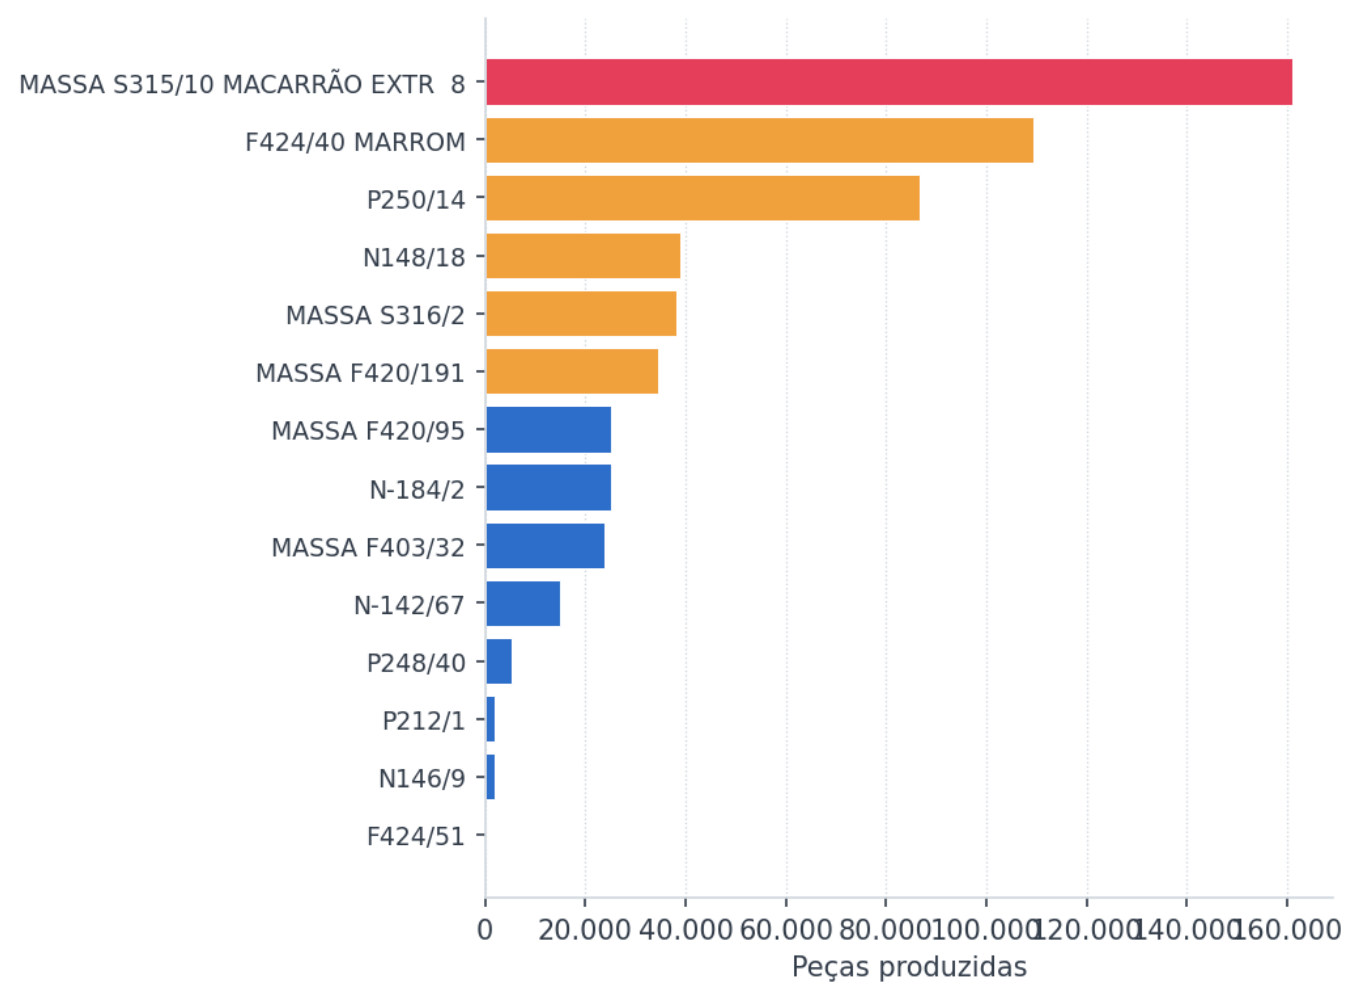

Composto Dominante

MASSA S315/10 MACARRÃO EXTR 8+/- 1mm

28,38 %
do total produzido

161.043
peças

14 meses com uso

3.979 peças refugadas

Composto	Produzido	% Total	Refugo	Meses
MASSA S315/10 MACARRÃO E	**161.043**	**28,38 %**	**3.979**	**14**
F424/40 MARROM	109.298	19,26 %	1.720	10
P250/14	86.698	15,28 %	2.433	13
N148/18	38.988	6,87 %	640	8
MASSA S316/2	38.167	6,73 %	665	8
MASSA F420/191	34.448	6,07 %	734	13

Controle de Qualidade — Taxa de Refugo

IJ-118

Refugo por Composto

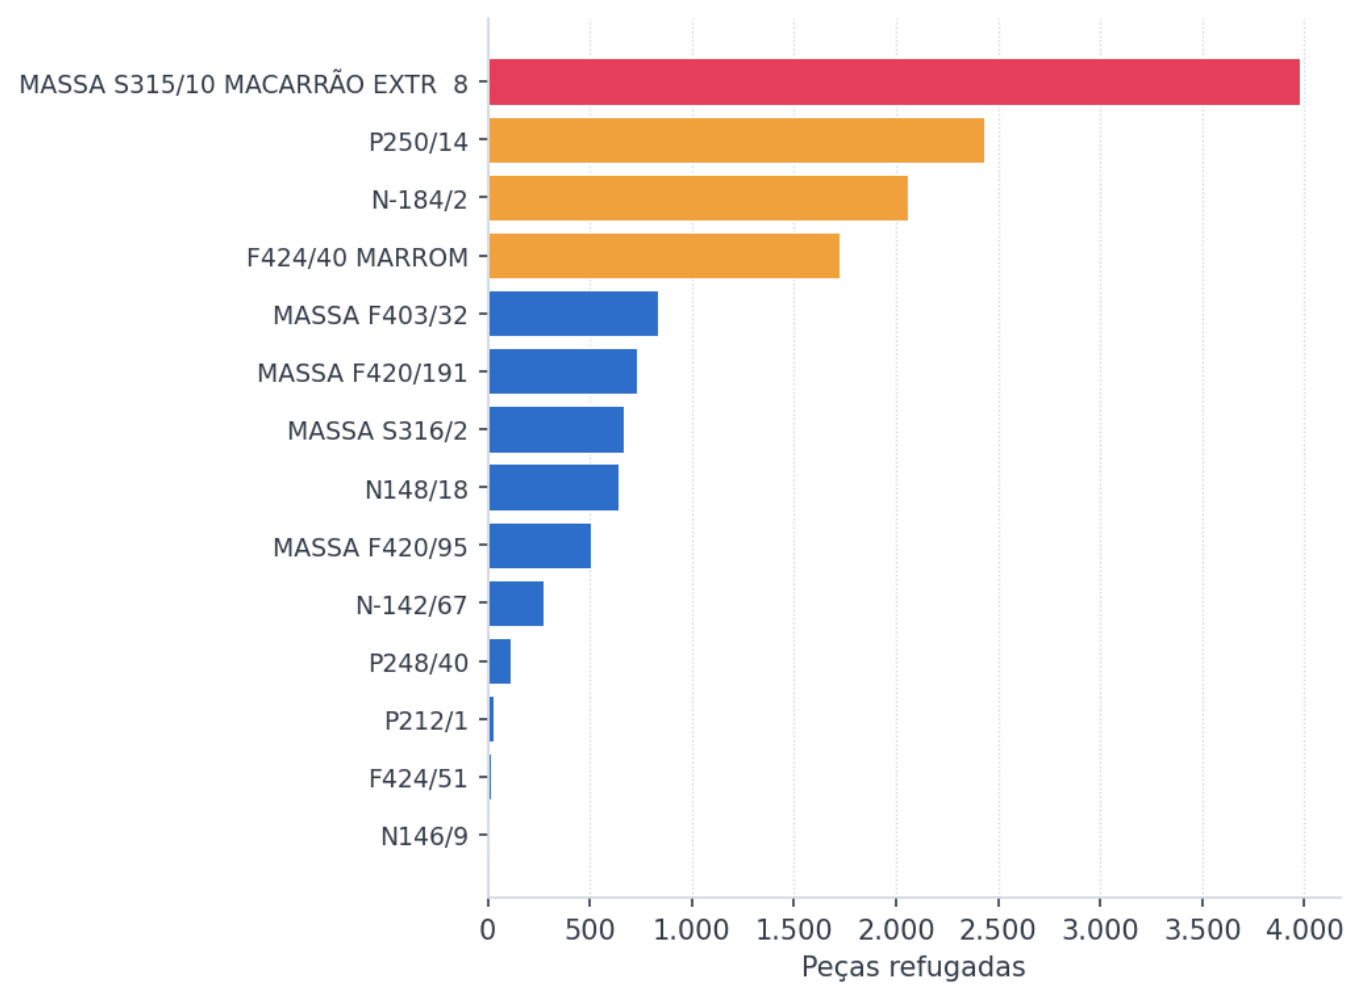

2,47 %

Taxa de Refugo Global

14.004
Peças refugadas

567.451
Total produzido

Atenção ao patamar

Análise de Qualidade

- MASSA S315/10 MACARRÃO EXTR 8+/- 1mm: maior volume de refugo absoluto (3.979 peças)
- ✓ Taxa mensal estável — sem pico de rejeição significativo
- Refugo geral próximo do limite — monitorar tendência

Estratégia de Manutenção Preventiva

IJ-118

Histórico de Manutenções RM.195

Componente	Valor Atual	Referência	Fator	Efeito
T_base	385,0	Mediana histórica	—	Ponto de partida
Ampl. cil./fuso	cil. 0,480 / fuso 1,100	—	1,0000	Fator neutro
Massa pós-troca	4.435,03	mediana janelas anteriores: 2.628,83	0,7000	consumiu **1,69×** a massa típica → antecipa a próxima troca (×0,700)
Ociosidade	27	Últ. prod. → hoje	—	Desliza data p/ frente
T_prescrito	**269,5 dias**	**385,0 × 1,0000 × 0,7000**	**—**	**Data: 24/12/2025**

ATRASADO

-124

dias restantes

24/12/2025

Próxima manutenção

Última troca: 02/03/2025

Níveis de Urgência

ATRASADO	< 0 dias
URGENTE	0 – 29 dias
ATENÇÃO	30 – 89 dias
✓ OK — ATUAL	≥ 90 dias

Conclusões e Insights Operacionais

IJ-118

Principais Conclusões

Produção Consistente

567.451 peças em 23 meses com pico histórico de 42.583 em Dez/2025

Dominância do MASSA S315/10 MACARRÃO EXTR 8+/- 1mm

28,38 % da produção — composto principal por 14 meses

Qualidade Controlada

Taxa de refugo de apenas 2,47 % — desempenho estável em todo o período

Manutenção Planejada

Próxima intervenção prevista para 24/12/2025 — -124 dias de folga operacional

Scorecard Operacional

Volume Total	**567.451 peças**
Período	**23 meses**
Compostos	**14 tipos**
Taxa de Refugo	**2,47 %**
Pico Mensal	**42.583 peças — Dez/2025**
Próxima Manutenção	**24/12/2025 (-124 dias)**
